



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

ถึง กกค.

เลขที่

วันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงาน และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ ไตไลน์ ๑๑๕ เควี Loop Line กฟอ.ท่าแซะ - สฟ.ท่าแซะ - สฟ.ปะทิว ช่วง ๔/๘ (ครั้งที่ ๓)

เรียน อก.กค.(ต.๑) ผ่าน รก.กค.(ต.๑)

๑. เรื่องเดิม

ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.ต.๑ - ๑๘๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กฟต.๑ ได้จ้างเหมาค่าแรงงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอนเนอจี ๒๐๑๓ ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ ไตไลน์ ๑๑๕ เควี Loop Line กฟอ.ท่าแซะ - สฟ.ท่าแซะ - สฟ.ปะทิว ช่วง ๔/๘ ค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๒,๒๕๑,๒๘๗.๔๕ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๕๗,๕๙๐.๑๒ บาท รวมเป็นจำนวนเงิน ๒,๔๐๘,๘๗๗.๕๗ บาท (สองล้านสี่แสนแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอนเนอจี ๒๐๑๓ ได้ทำหนังสือขอส่งมอบงานจ้าง โดยเป็นการขอส่งงานมอบตามปริมาณงานที่ดำเนินการได้ตามสัญญา (ครั้งที่ ๓)

๒.๒ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจสอบ งานก่อสร้างฯ ตามปริมาณงานที่ดำเนินการ (ครั้งที่ ๓) แล้ว สรุปว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอนเนอจี ๒๐๑๓ ได้ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวแล้วเสร็จ ถูกต้องตามแบบและมาตรฐาน กฟผ. โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการอยู่ในระยะเวลาของสัญญา


๒.๓ สั่งจ่ายเงินค่าก่อสร้าง ตามปริมาณงานที่ดำเนินการได้

(๑.) ค่าจ้าง(ครั้งที่ ๓)	เป็นเงิน	๕๔๗,๒๐๙.๖๐	บาท
(๒.) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๓๘,๓๐๔.๖๗	บาท
(๓.) รวมเงินค่าจ้างทั้งหมด ข้อ(๑.)+ข้อ(๒.)	เป็นเงิน	๕๘๕,๕๑๔.๒๗	บาท

(ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบสี่บาทยี่สิบบเจ็ดสตางค์) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๓. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรรับมอบงานจ้างตามปริมาณงานที่ดำเนินการได้ (ครั้งที่ ๓) และอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอนเนอจี ๒๐๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๕๘๕,๕๑๔.๒๗ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบสี่บาทยี่สิบบเจ็ดสตางค์) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

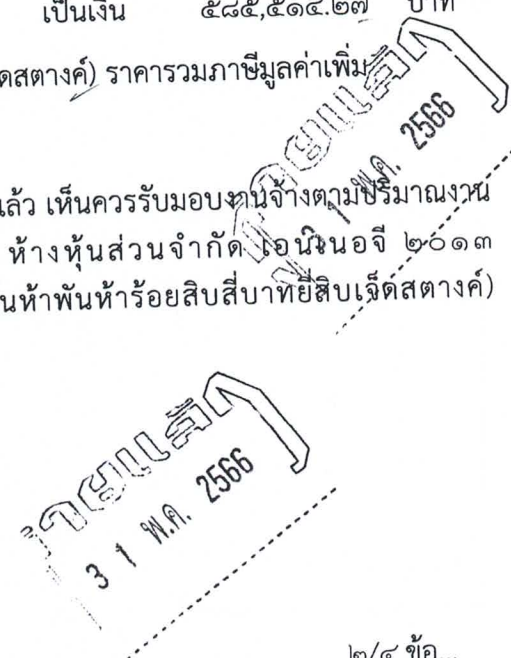

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓. เบิกจ่ายเงินให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอนเนอจี ๒๐๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๕๘๕,๕๑๔.๒๗ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบสี่บาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมนี้ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องและเรื่องเดิมมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายคณิพล ศรีเกตุ)
ผ.กร.กคค.(๓.๑)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวีระพันธุ์ สิทธิยากรณ์)
ผ.กส. กพอ.ทช.

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพรเทพ พวงผกา)
ชผ.กร.กคค.(๓.๑)

ที่ ต.๑ กคค.(กร.)๖๓๓๖/๒๕๖๖

เรียน ผ.กร.(๓.๑)

อนุมัติ-ดำเนินการต่อไป

(นายบุญรัตน์ ไม้แก้ว)

ร.ก.คค.(๓.๑) รักษาการแทน อ.ก.คค.(๓.๑)

๒๙ พ.ค. ๒๕๖๖

จ่ายแล้ว
๒๙ พ.ค. ๒๕๖๖

รายการส่งมอบงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายยา ใช้โลโก้ 115 เควี Loop Line กทม.ทางขอ - สฟ.ทางขอ - สฟ.ประทิว ช่วง 4/8

ที่	รายการ	ราคา/หน่วย	ตามสัญญาจ้าง		สรุปส่งงานครั้งที่ 1		สรุปเบิกจ่ายเงิน (ครั้งที่ 1)		สรุปส่งงานครั้งที่ 2		สรุปเบิกจ่ายเงิน (ครั้งที่ 2)		สรุปส่งงานครั้งที่ 3		สรุปเบิกจ่ายเงิน (ครั้งที่ 3)	
			จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
	รายการ															
	แผนกติดตั้งแรงสูง															
1	ชุดหม้อเสา คอรับยาว 12.20 ม.	4,147.00	39	161,733.00	-	-	38	111,969.00	27	111,969.00	5	20,735.00	5	20,735.00		
2	ติดตั้งคอมมิวนิเคเตอร์แรง (คอรับ)แบบสเปนแรงสูง	279.00	68	18,972.00	-	-	38	10,602.00	38	10,602.00	11	3,069.00	11	3,069.00		
3	ชุดหม้อปีกเสาคอนกรีต คอรับ	2,929.00	1	2,929.00	-	-	1	2,929.00	1	2,929.00	2	-	2	-		
4	ติดตั้งถ้ำนสมอบก แบบพ่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2000	97.00	10	970.00	-	-	5	485.00	5	485.00	2	194.00	2	194.00		
5	ติดตั้งนสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก	2,926.00	10	29,260.00	-	-	5	14,630.00	5	14,630.00	2	5,852.00	2	5,852.00		
6	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก	54.00	315	17,010.00	-	-	288	15,552.00	288	15,552.00	6	-	6	-		
7	ติดตั้งเหล็กประกบ	66.00	128	8,448.00	-	-	76	5,016.00	76	5,016.00	10	396.00	6	396.00		
8	ติดตั้งท่อฟ้า	164.00	31	5,084.00	-	-	25	4,100.00	25	4,100.00	10	1,640.00	6	984.00		
9	ติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม.	6.95	164	1,139.80	-	-	126	875.70	126	875.70	18	125.10	18	125.10		
10	ติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม.	4.30	5,785	24,875.50	-	-	5,423	23,318.90	5,423	23,318.90	80	344.00	80	344.00		
11	ติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม.	3.25	146	473.20	-	-	146	474.50	146	474.50	80	-	80	-		
12	ติดตั้งเหล็กคอนกรีตอัดอากาศทางฝั่ง	279.00	201	56,079.00	-	-	213	59,427.00	201	56,079.00	80	-	80	-		
13	ติดตั้งลูกถ้วยโกลนไฟฟฟ้า	164.00	689	112,996.00	-	-	735	120,540.00	689	112,996.00	80	-	80	-		
14	ติดตั้งสายออลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน	4.15	7	29.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	ติดตั้งเคเบิ้ลออกอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x185	10.15	17,870	181,380.50	-	-	17,870	181,380.50	17,870	181,380.50	80	-	80	-		

รายการส่งมอบงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ ไฟโตลีน 115 เควี Loop Line กทม. phases - สฟ. phases - สฟ. phase ขวง 4/8

ที่	รายการ	ราคา/หน่วย	ตามสัญญาจ้าง		สรุปส่งงานครั้งที่ 1		สรุปเบิกจ่ายเงิน (ครั้งที่ 1)		สรุปส่งงานครั้งที่ 2		สรุปเบิกจ่ายเงิน (ครั้งที่ 2)		สรุปส่งงานครั้งที่ 3		สรุปเบิกจ่ายเงิน (ครั้งที่ 3)	
			จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
	แผนกรื้อถอนแรงสูง															
1	รื้อถอนเสา คอรับขา 12.20 ม.	2,229.00	175	390,075.00	157	349,953.00	157	349,953.00								
2	รื้อถอนเสาตอม่อ คอรับ	1,463.00	15	21,945.00	15	21,945.00	15	21,945.00								
3	รื้อถอนคานคอนกรีตค้ำแรง(คอรับ)	139.00	67	9,313.00	67	9,313.00	67	9,313.00								
4	รื้อถอนคานคอนกรีตค้ำแรง(คอรับ)แบบสลับแรงสูง	139.00	72	10,008.00	52	7,228.00	52	7,228.00								
5	รื้อถอนเหล็กคานค้ำแรง(คอรับ)แบบสลับแรงสูง	139.00	115	15,985.00	74	10,286.00	74	10,286.00								
6	รื้อถอนเหล็กค้ำรับกับ	33.00	272	8,976.00	246	8,118.00	246	8,118.00								
7	รื้อถอนตุ๊กด้วยแยกสายไฟฟ้า	82.00	273	22,386.00	259	21,238.00	259	21,238.00								
8	รื้อถอนลวดเหล็กตีเกลียว 25 คมม.	1.60	229	366.40	8	12.80	8	12.80								
9	รื้อถอนสายออลูมิเนียมพื้นที่บดลื้อ 185 คมม.	5.20	18,030	93,756.00	14,340	74,568.00	14,340	74,568.00								
10	รื้อถอนลวดเหล็กตีเกลียว 50/7	2.35	5,354	12,581.90	4,810	11,303.50	4,810	11,303.50								
11	รื้อถอนสายออลูมิเนียมตีเกลียว	2.40	6	14.40	6	14.40	6	14.40								
12	รื้อถอนตุ๊กด้วยไฟสเฟทไฟ 22 เควี	82.00	422	34,604.00	332	27,224.00	332	27,224.00								
13	รื้อถอนตุ๊กด้วยแขวนแบบ ก	27.00	489	13,203.00	453	12,231.00	453	12,231.00								
14	รื้อถอนลื้อฟ้า	82.00	24	1,968.00	6	492.00	6	492.00								
15	รื้อถอนคอรอเพอเอาฟ้าลื้อฟ้า	149.00	2	298.00												
16	รื้อถอนลื้อค้ำเปิดได้เมื่อมีหลอด	1,739.00	1	1,739.00	1	1,739.00	1	1,739.00								
	รวมแผนกรื้อถอนแรงสูง			637,218.70		555,665.70		555,665.70						32,700.10		30,168.50

รายการส่งมอบงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ ได้โลโก้ 115 เควี Loop Line กพอ.ท่ามะขะ - สฟ.ท่ามะขะ - สฟ.ประจักษ์ ช่าง 4/8

ที่	รายการ	ราคา/หน่วย	ตามสัญญาจ้าง		สรุปส่งงานครั้งที่ 1		สรุปเบิกจ่ายเงิน (ครั้งที่ 1)		สรุปส่งงานครั้งที่ 2		สรุปเบิกจ่ายเงิน (ครั้งที่ 2)		สรุปส่งงานครั้งที่ 3		สรุปเบิกจ่ายเงิน (ครั้งที่ 3)	
			จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
	แผนกร้อยดอนDetour Line															
1	ร้อยดอนคอนกรีตอัดแรง(เคอร์.)แบบสี่มุมสูง	139.00	34	4,726.00								41	5,699.00	34	4,726.00	
2	ร้อยดอนเสาคอนกรีต 14 เมตร	2,229.00	7	15,603.00								9	20,061.00	7	15,603.00	
3	ร้อยดอนเหล็กประกำ	33.00	68	2,244.00								82	2,706.00	68	2,244.00	
4	ร้อยดอนตุ๊กตัวโลหะ	82.00	46	3,772.00								42	3,444.00	42	3,444.00	
5	ร้อยดอนตุ๊กตัวโลหะ ก	27.00	96	2,592.00								128	3,456.00	96	2,592.00	
6	ร้อยดอนสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50/8 คมม.	2.40	960	2,304.00								1,320	3,168.00	960	2,304.00	
7	ร้อยดอนตรอกไฟฟ้า	149.00	16	2,384.00								21	3,129.00	16	2,384.00	
	รวมแผนกร้อยดอนDetour Line			33,625.00									41,663.00			33,297.00

รายการส่งมอบงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ ไฟโตลีน 115 เควี Loop Line กฟผ.ฟานชะ - สฟ.ฟานชะ - สฟ.ปะทิว ช่วง 4/8

ที่	รายการ	ราคา/หน่วย	ตามสัญญาจ้าง		สรุปส่งงานครั้งที่ 1		สรุปเบิกจ่ายเงิน (ครั้งที่ 1)		สรุปส่งงานครั้งที่ 2		สรุปเบิกจ่ายเงิน (ครั้งที่ 2)		สรุปส่งงานครั้งที่ 3		สรุปเบิกจ่ายเงิน (ครั้งที่ 3)	
			จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
	แผนกติดตั้งแรงต่ำ															
1	ชุดหม้อแปลงเสา คอ. ขนาด 9 เมตร	2,524.00	71	179,204.00				1	2,524.00		1	2,524.00	73	184,252.00	70	176,680.00
2	ติดตั้งเสา คอ.	2,926.00	15	43,890.00									5	14,630.00	5	14,630.00
3	ติดตั้งแผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก	2,926.00	5	14,630.00									4	11,704.00	4	11,704.00
4	กำหนดอบก แบบห้วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2000 มม.	97.00	5	485.00									4	388.00	4	388.00
5	ติดตั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก 50/8 ต.มม.	164.00	181	29,684.00									91	14,924.00	91	14,924.00
6	ติดตั้งสายล่อฟ้า	3.65	360	1,314.00									180	657.00	180	657.00
7	ติดตั้งสายล่อฟ้า	3.40	12,960	44,064.00									13,455	45,747.00	12,960	44,064.00
8	ติดตั้งสายล่อฟ้า	279.00	8	2,232.00									2	558.00	2	558.00
9	ติดตั้งกราวด์	571.00	17	9,707.00									20	11,420.00	17	9,707.00
10	ติดตั้งหม้อแปลงต่ำ	365.00	165	60,225.00									171	62,415.00	165	60,225.00
11	ฝังชื่อ	103.00	51	5,253.00									20	2,060.00	20	2,060.00
12	ติดตั้งเหล็กประกับ	66.00	16	1,056.00									5	330.00	5	330.00
13	ติดตั้งหม้อ	164.00	268	43,952.00									238	39,032.00	238	39,032.00
14	ติดตั้งล่อฟ้า	152.00	31	4,712.00									32	4,864.00	31	4,712.00
	รวมแผนกติดตั้งแรงต่ำ			440,408.00										392,981.00		379,671.00

รายการส่งมอบงานจ้างหมาบปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ ใต้โลโก้ 115 เควี Loop Line กพอ.ฟาร์มชะ - สฟ.ฟาร์มชะ - สฟ.ประทีพ ช่วง 4/8

ที่	รายการ	ราคาหน่วย	ตามสัญญาจ้าง		สรุปส่งงานครั้งที่ 1		สรุปเบิกจ่ายเงิน (ครั้งที่ 1)		สรุปส่งงานครั้งที่ 2		สรุปเบิกจ่ายเงิน (ครั้งที่ 2)		สรุปส่งงานครั้งที่ 3		สรุปเบิกจ่ายเงิน (ครั้งที่ 3)	
			จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน	จำนวน	เป็นเงิน
	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ															
1	รื้อถอนสายออลูมิเนียมเบเรียว 50/77 ต.มม.	1.80	4,190	7,542.00												
2	รื้อถอนคอนกรีตเทอร์เข้าสายสาย	82.00	123	10,086.00	97	7,954.00	97	7,954.00								
3	รื้อถอนเสาออลูมิเนียมตัดกึ่งยาวชนิดอัดแน่นทุ้งฉนวน	1.80	8,070	14,526.00	8,070	14,526.00	8,070	14,526.00								
4	รื้อถอนเหล็ก	82.00	170	13,940.00	142	11,644.00	142	11,644.00								
5	รื้อถอนมิเตอร์แรงต่ำ	182.00	165	30,030.00	140	25,480.00	140	25,480.00								
6	รื้อถอนเสาคอนกรีต 8 เมตร	1,040.00	-18	18,720.00	16	16,640.00	16	16,640.00								
	รวมแผนกรื้อถอนแรงต่ำ															
				94,844.00		76,244.00		76,244.00								
	แผนกก่อสร้างเคเบิลใยแก้วนำแสง															
1	OPTIC FIBER FIGURE-8 G.652D 24 CORE	34.00	5,330	181,220.00					5,330	181,220.00	5,330	181,220.00	245	8,330.00		
2	ติดตั้งกราวด์รื้อถอน	2,433.00	5	12,165.00									4	9,732.00	4	9,732.00
	รวมแผนกก่อสร้างเคเบิลใยแก้วนำแสง															
				193,385.00		-		-					181,220.00	18,062.00		9,732.00
	แผนกรื้อถอนเคเบิลใยแก้วนำแสง															
1	OPTIC FIBER FIGURE-8 G.652D 24 CORE	17.00	5,330	90,610.00	4,890	83,130.00	4,890	83,130.00	440	7,480.00	440	7,480.00				
	รวมแผนกรื้อถอนเคเบิลใยแก้วนำแสง															
				90,610.00		83,130.00		83,130.00								
	รวม															
				2,251,287.45		727,937.70		727,937.70		779,833.90		763,083.90		585,811.20		547,209.60
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %															
				157,590.12		50,955.64		50,955.64		54,588.37		53,415.87		41,006.78		38,304.67
	รวมเป็นเงิน															
				2,408,877.57		778,893.34		778,893.34		834,422.27		816,499.77		626,817.98		585,514.27
